



ES 17.9.2019

18 Solarpanel anstatt 24.




Fotos relativ unstrukturiert



Teak nur aufgelegt. Muss noch geschliffen, lackiert und befestigt werden.



Keller im Bug. Es ist nicht alles angeschlossen. Wir wissen nicht was wofür ist.

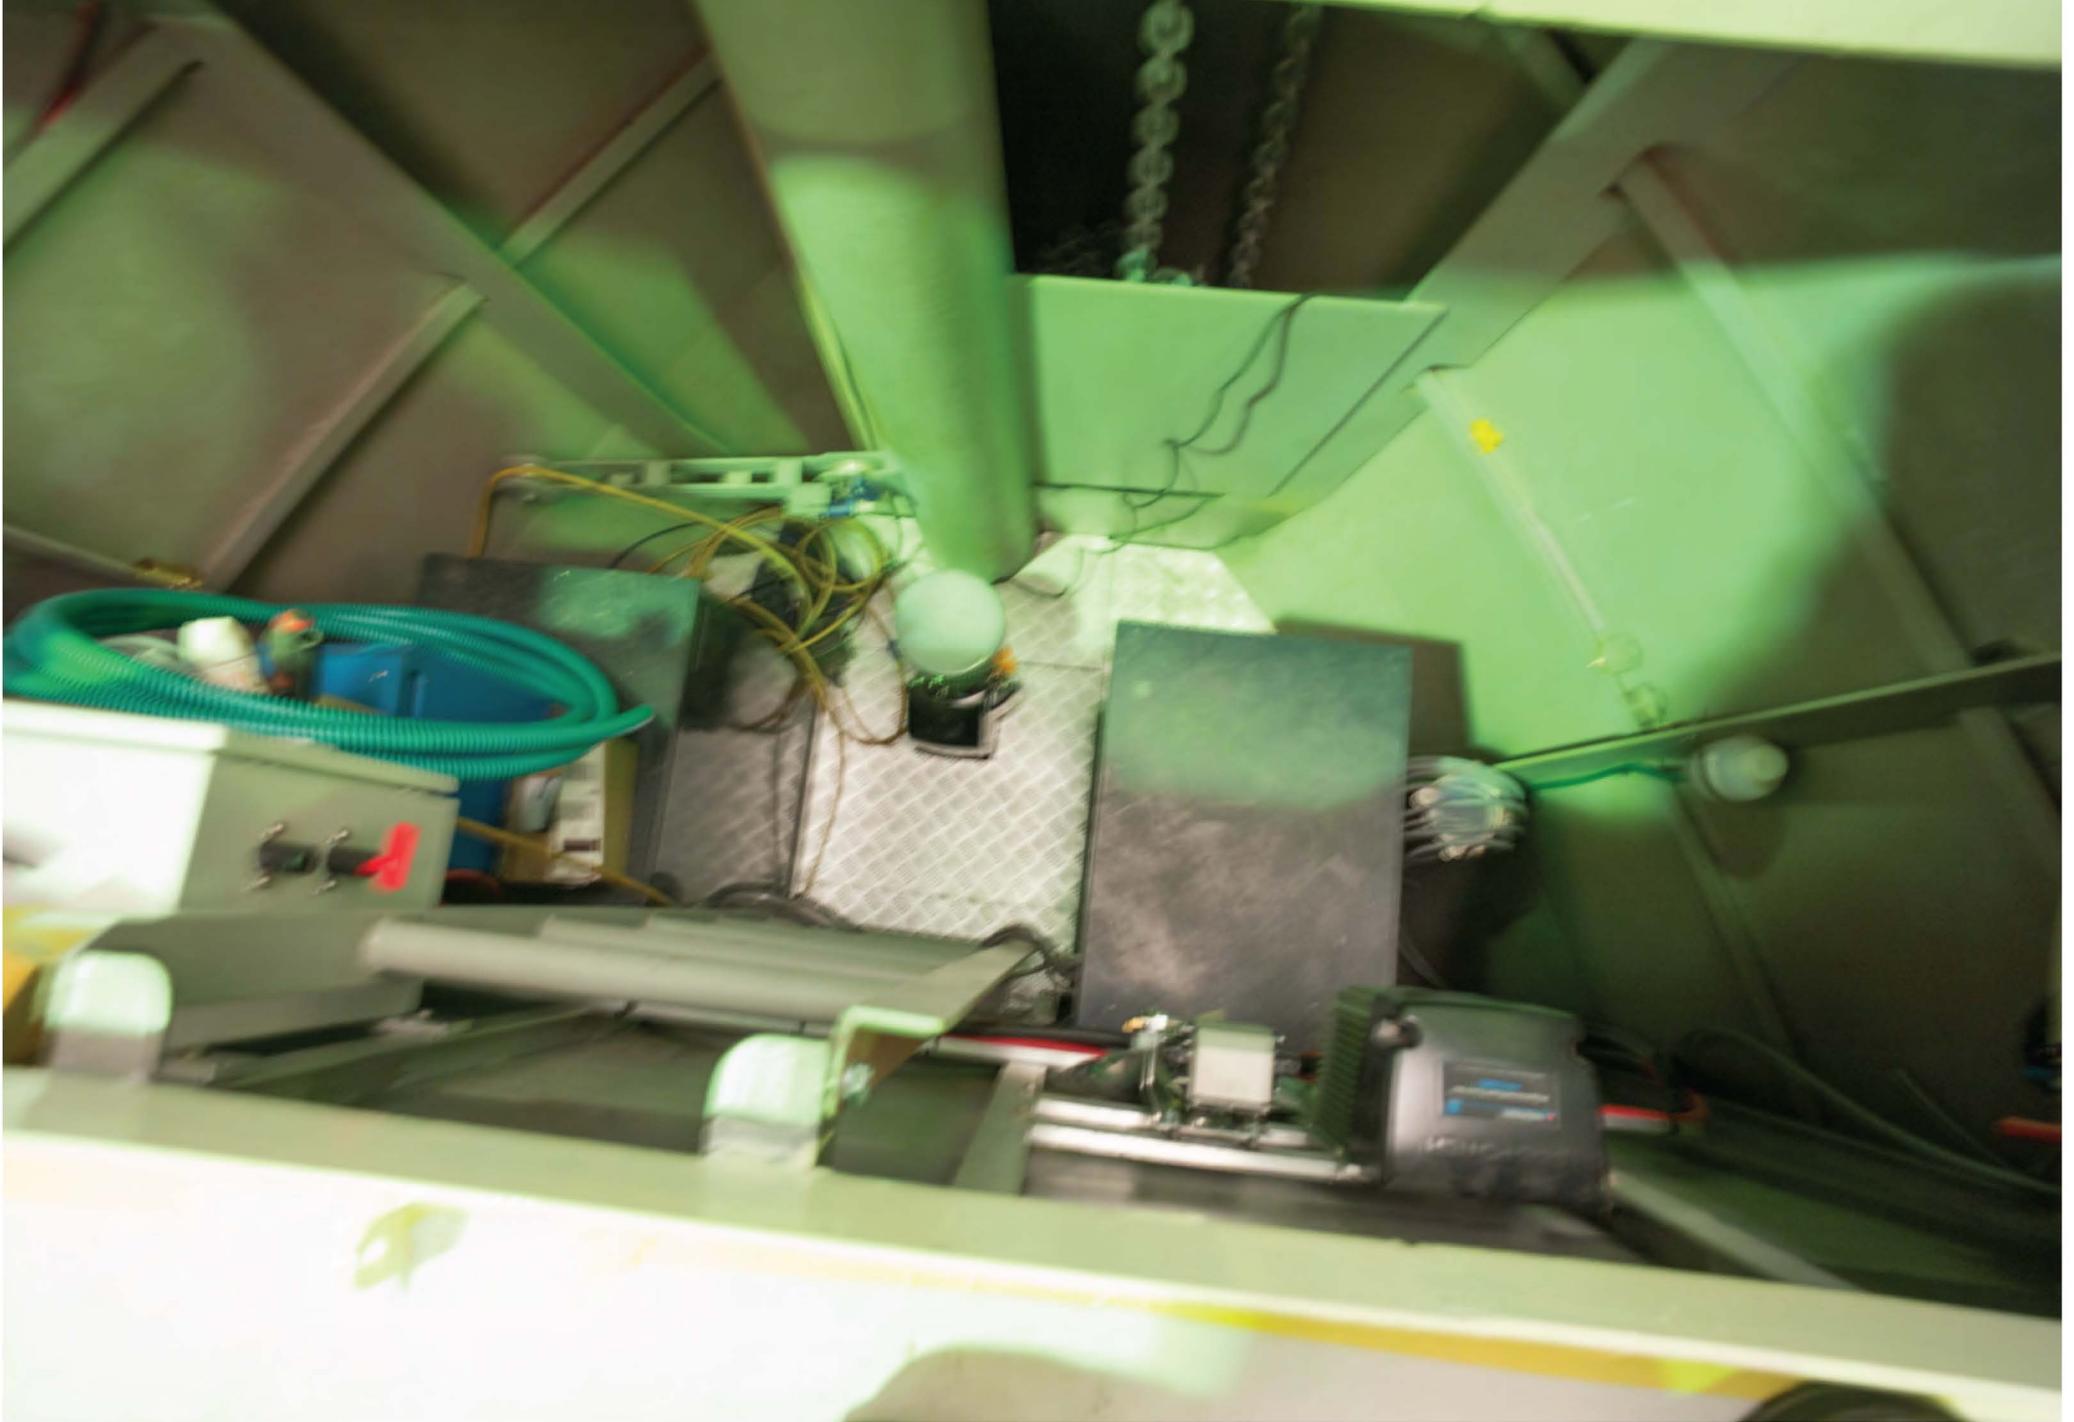

Die nicht bestellten zusätzlichen Batterien sind immer noch drin 2'800.-. Spudpal nicht angehängt.



Steuerrad nicht befestigt, keine Navigationsgeräte, Glasplatte lose aufliegend, nichts verbunden. Fenster nirgendwo verkittet (aussen und innen).



Situation unter dem Cockpit.



Abwaschmaschine nicht angeschlossen. Schranktüre nicht befestigt.



Wasser nicht angeschlossen. Spiegel fehlt noch.



Bett funktioniert (elektrisch). Schlafzimmer ok. Ausser Kittfugen Decke und Boden nicht vorhanden.



Lavabo nicht befestigt, Wasser nicht angeschlossen, Dusche nicht angeschlossen. Fenster nicht abgearbeitet.



Ankleideeraum. Tablare in den Schränken fehlen noch, Kleiderstange fehlt noch.



Unter der Treppe. Schaltkasten. Ist noch in Bearbeitung - Stromkabel nicht angeschlossen etc.



Schaltkasten unter der Treppe.



Wäschekammer. Tumbler und WM müssen noch vertauscht werden, damit die Türen richtig öffnen. Steckdose im Schrank fehlt noch.



Gästekabine ausser Kittfugen Böden, Fenster, Decke soweit OK.



Gästekabine ausser Kittfugen Böden, Fenster, Decke soweit OK.



Gästekabine ausser Kittfugen Böden, Fenster, Decke soweit OK. Airco nicht getestet.



Grosser Kratzer im Boden. Jim hat das auch fotografiert.



Küche, Kitt fehlt überall. Glasplatten lose aufgelegt. Maschinen nicht angeschlossen.




Salon: alle Kittfugen und Vorhangstangen fehlen. Es braucht diverse Farbkorrekturen. LED Band links fehlt.




Belüftung Dampfabzugshaube funktioniert noch nicht. 18 anstatt 24 Solarpanels.



LED Lampen Aussenseite fehlen. Kittfugen an den Fenstern fehlen. Scheibenwischer fehlen.

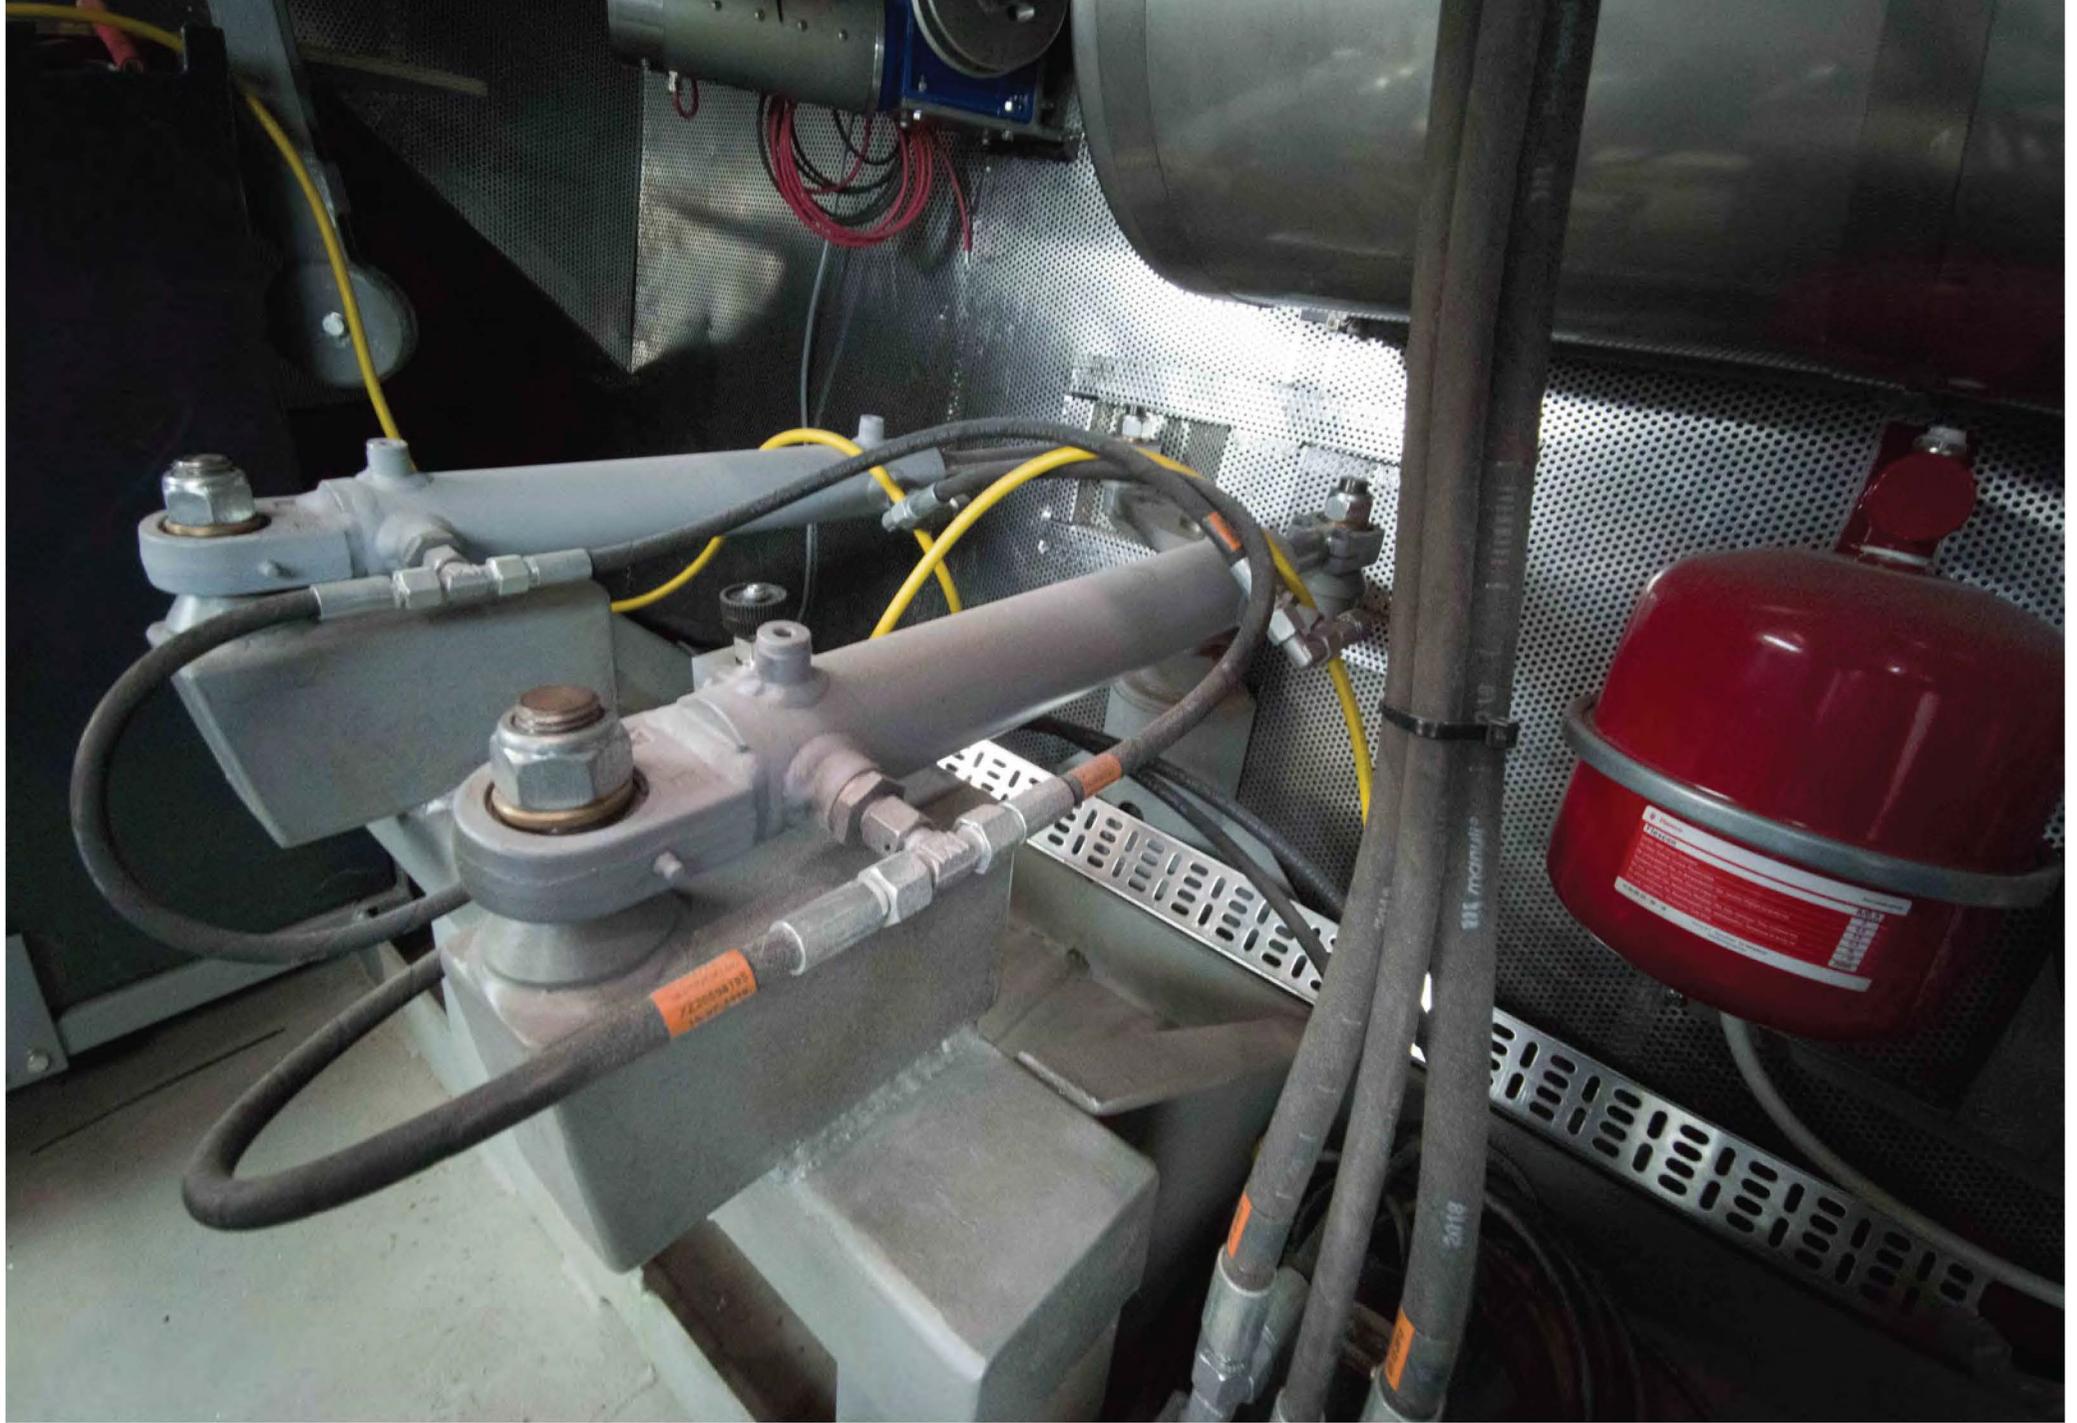

Ruder angehängt.

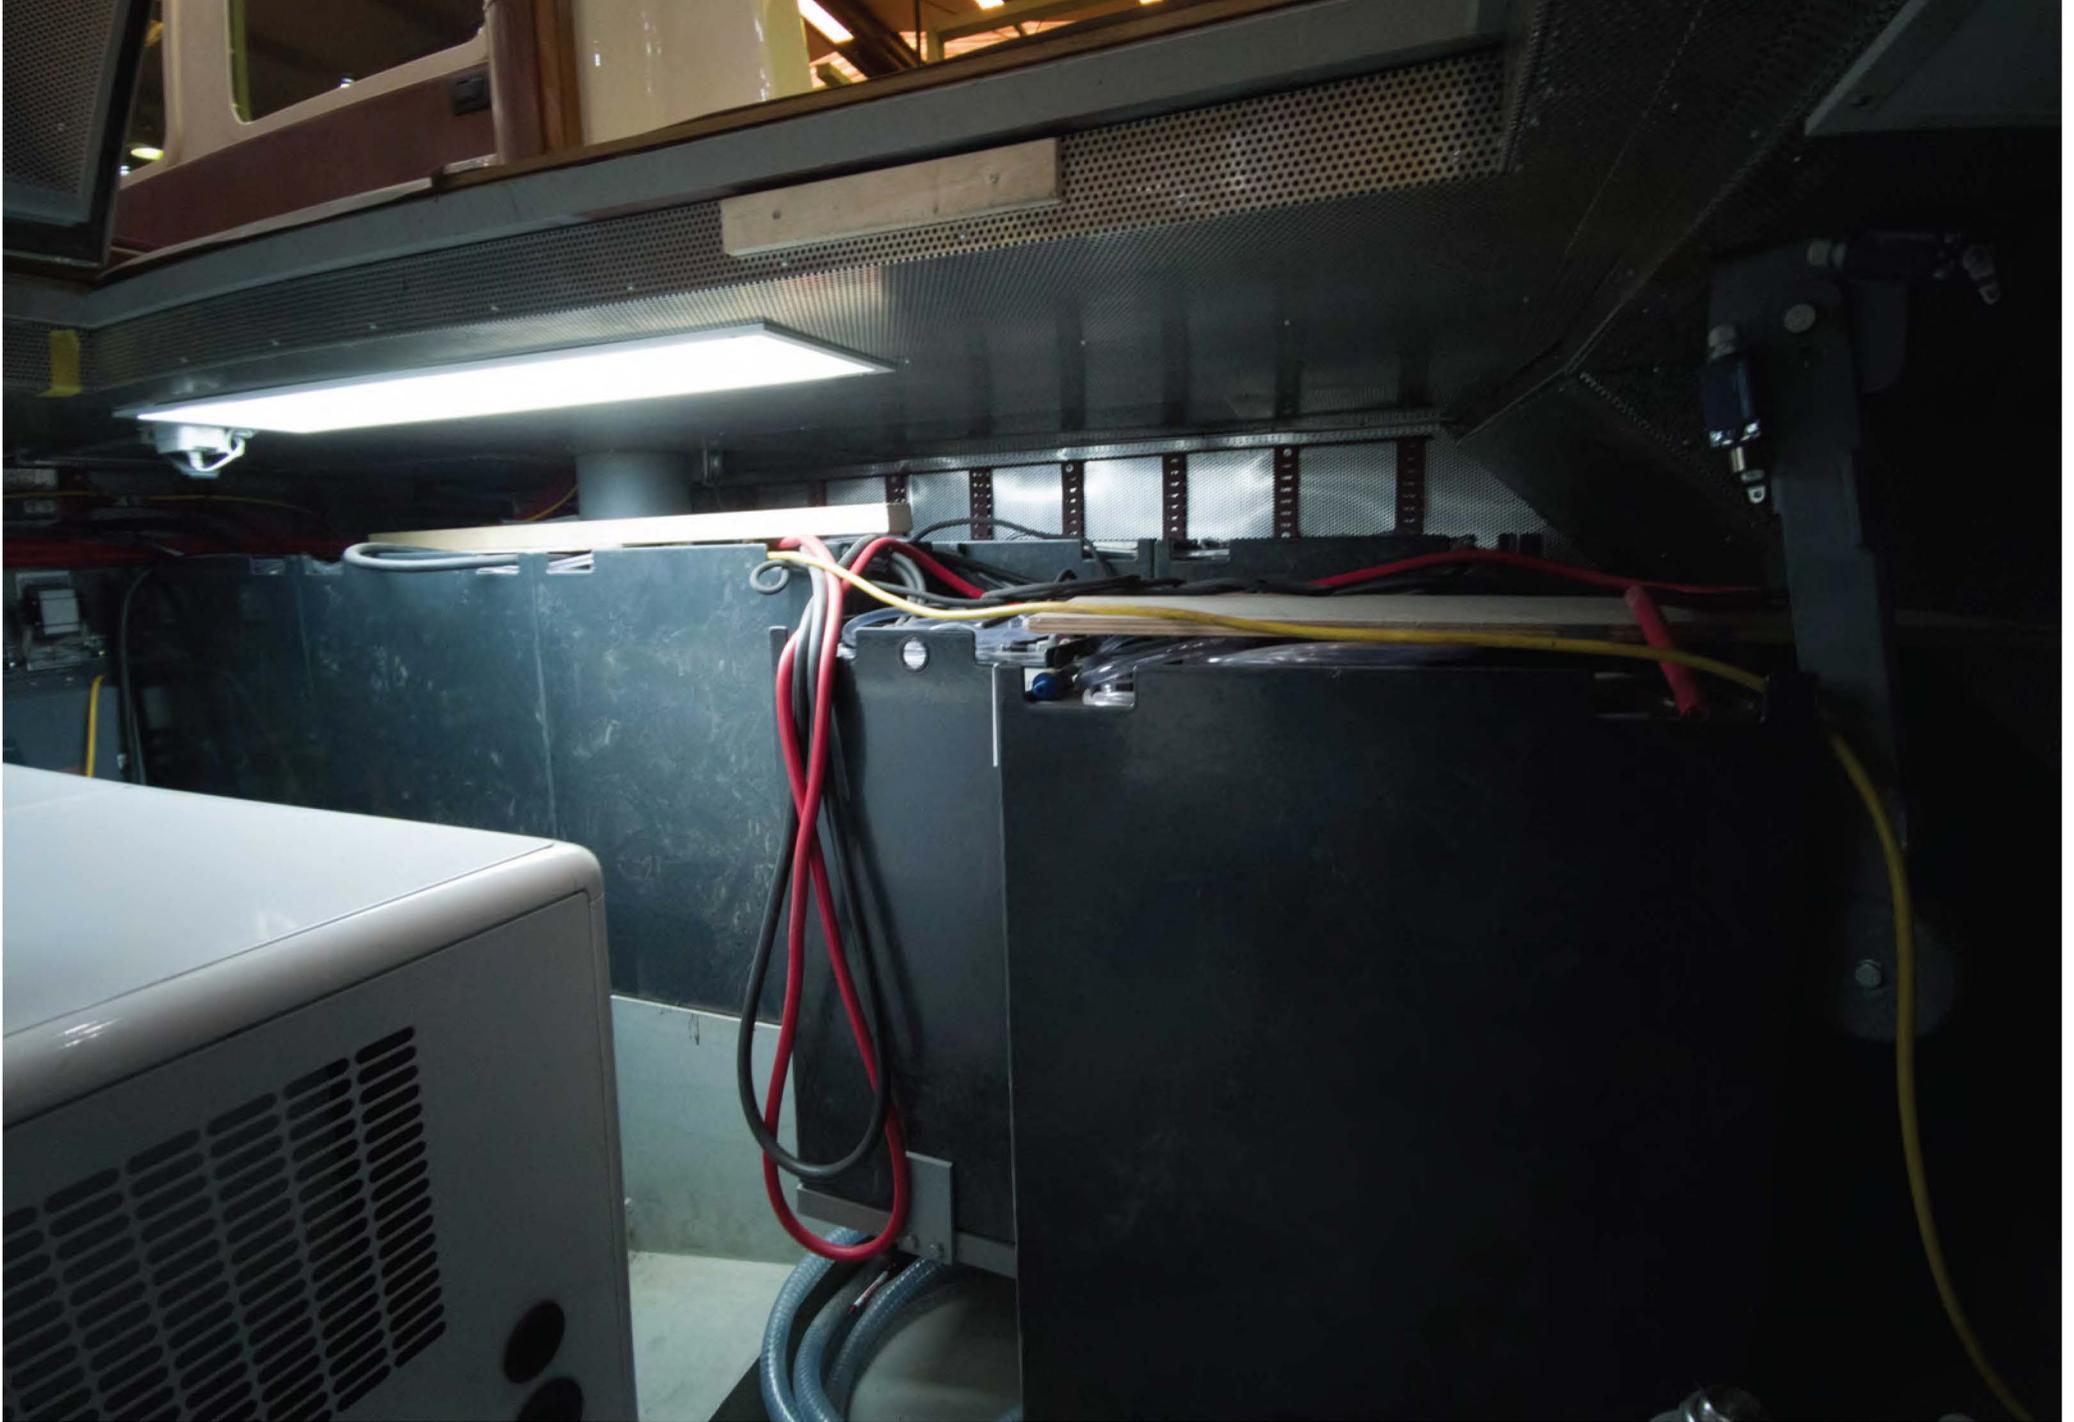


Batterien. Kabel liegen ungeordnet da. Angeschlossen? Lüftung fehlt völlig. Batterien nicht komplett installiert.



Querstrahlruder fehlt, Loch dafür fehlt, es fehlt alles komplett.




Es hat nur einen 3.5 KW Inverter. Wir hatten verlangt, Platz für einen zweiten Inverter zu lassen. Es wird später ein zweiter Inverter benötigt werden. Wir brauchen den vorgesehenen Platz dafür. Die zwei Pumpen für das Füllsystem der Batterien wurden noch nicht angeschlossen und das Kühlsystem auch nicht.

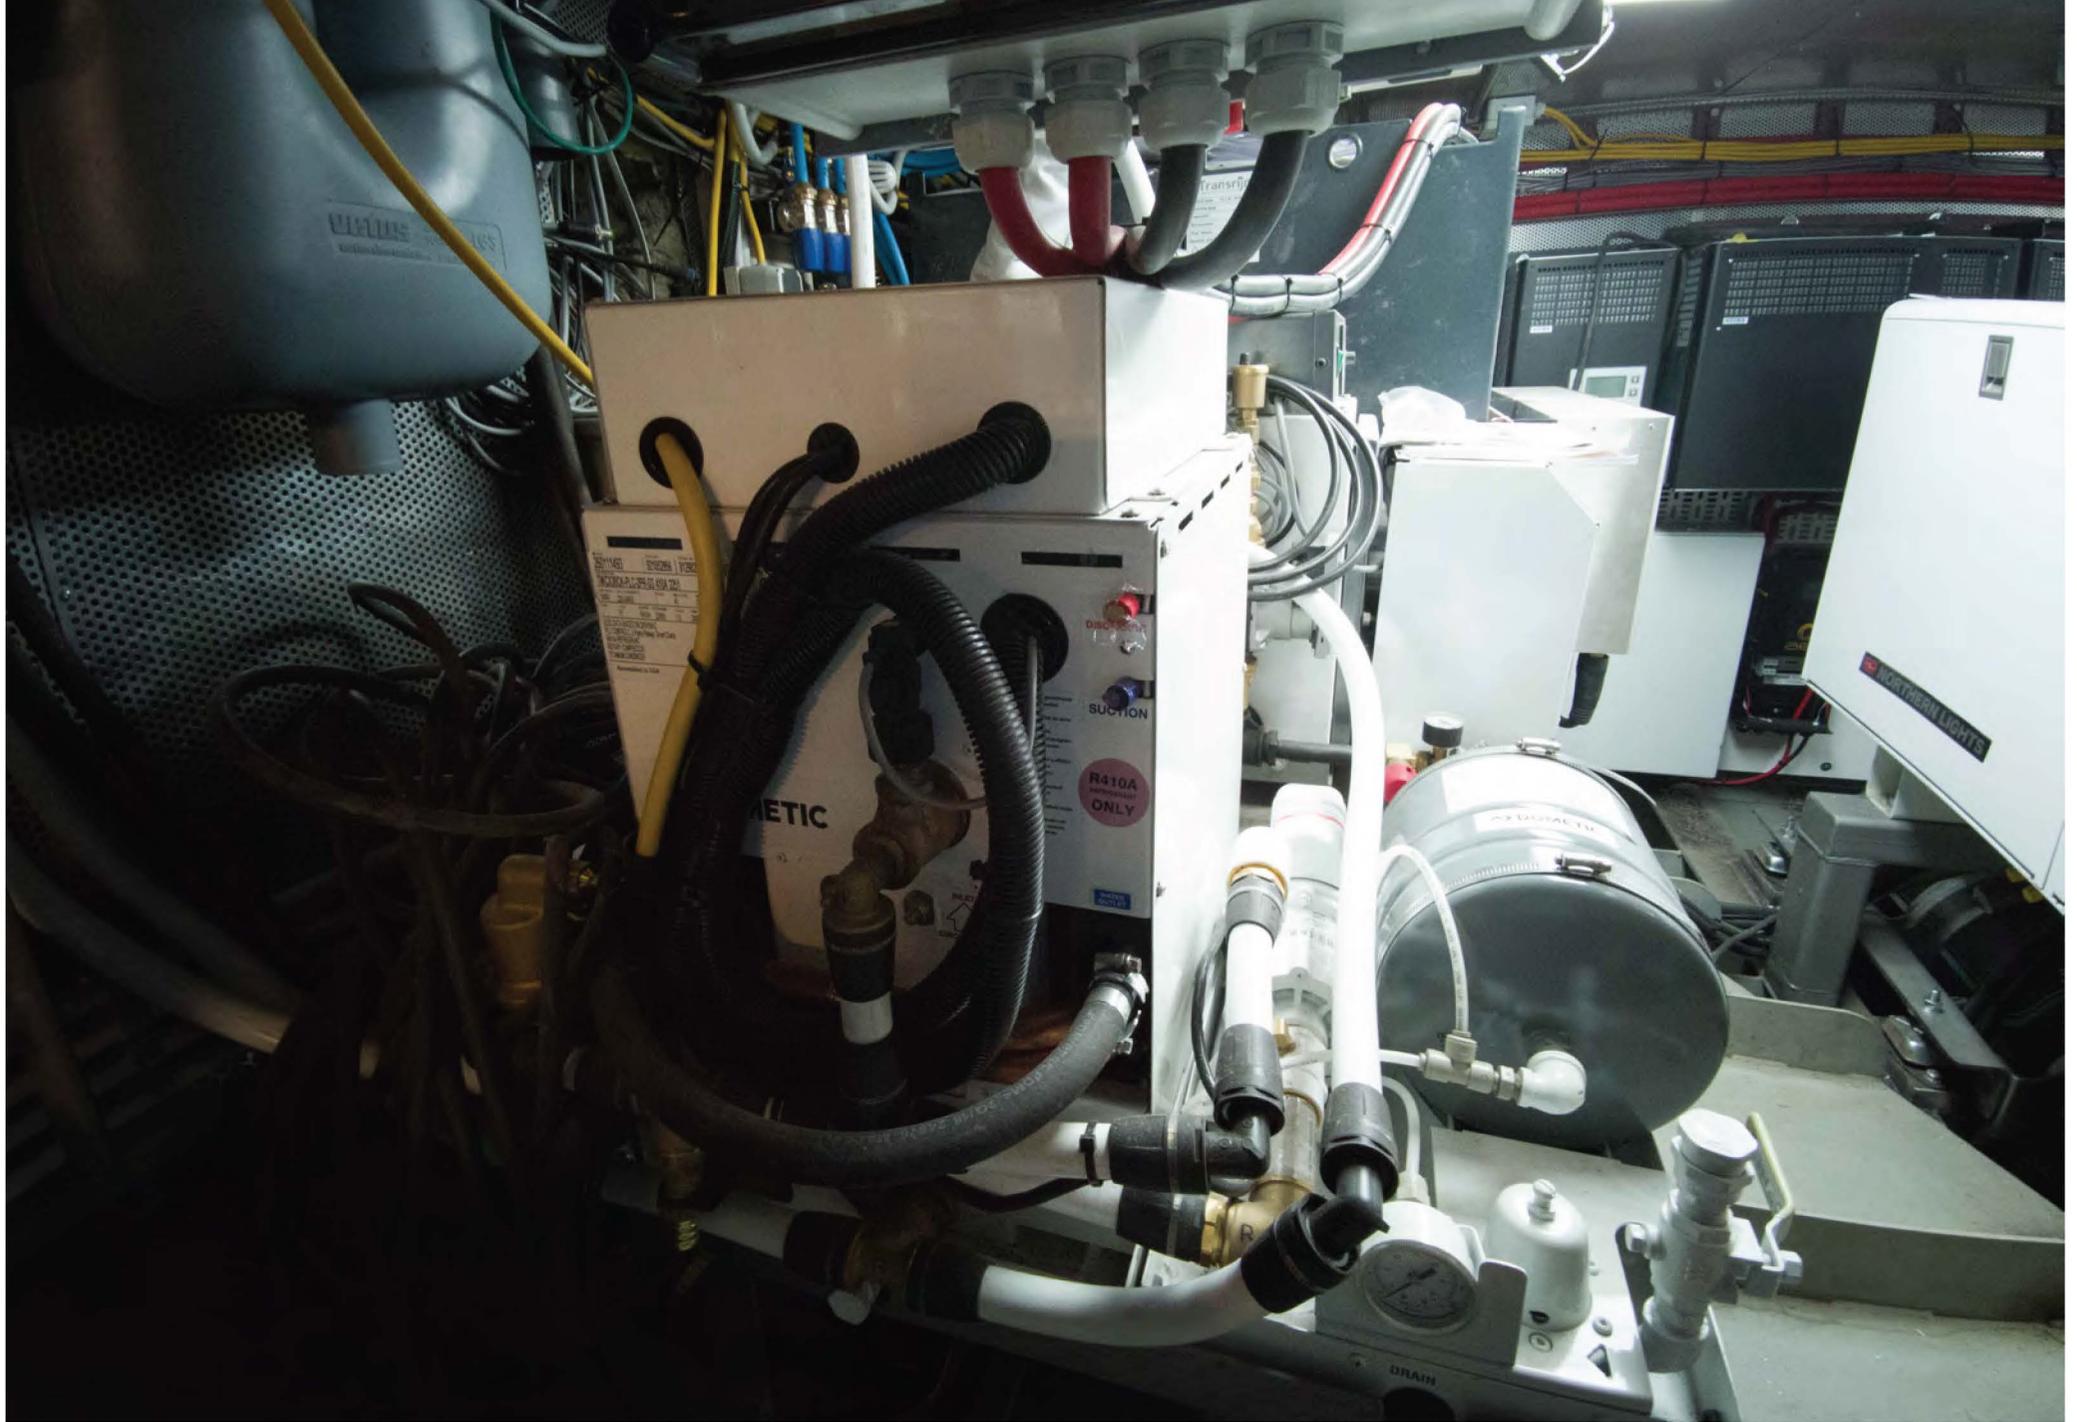

Airco und Heizung. Konnten nicht getestet werden.



Der zu kleine 25 KW Generator nur aufgesetzt und nicht angeschlossen.

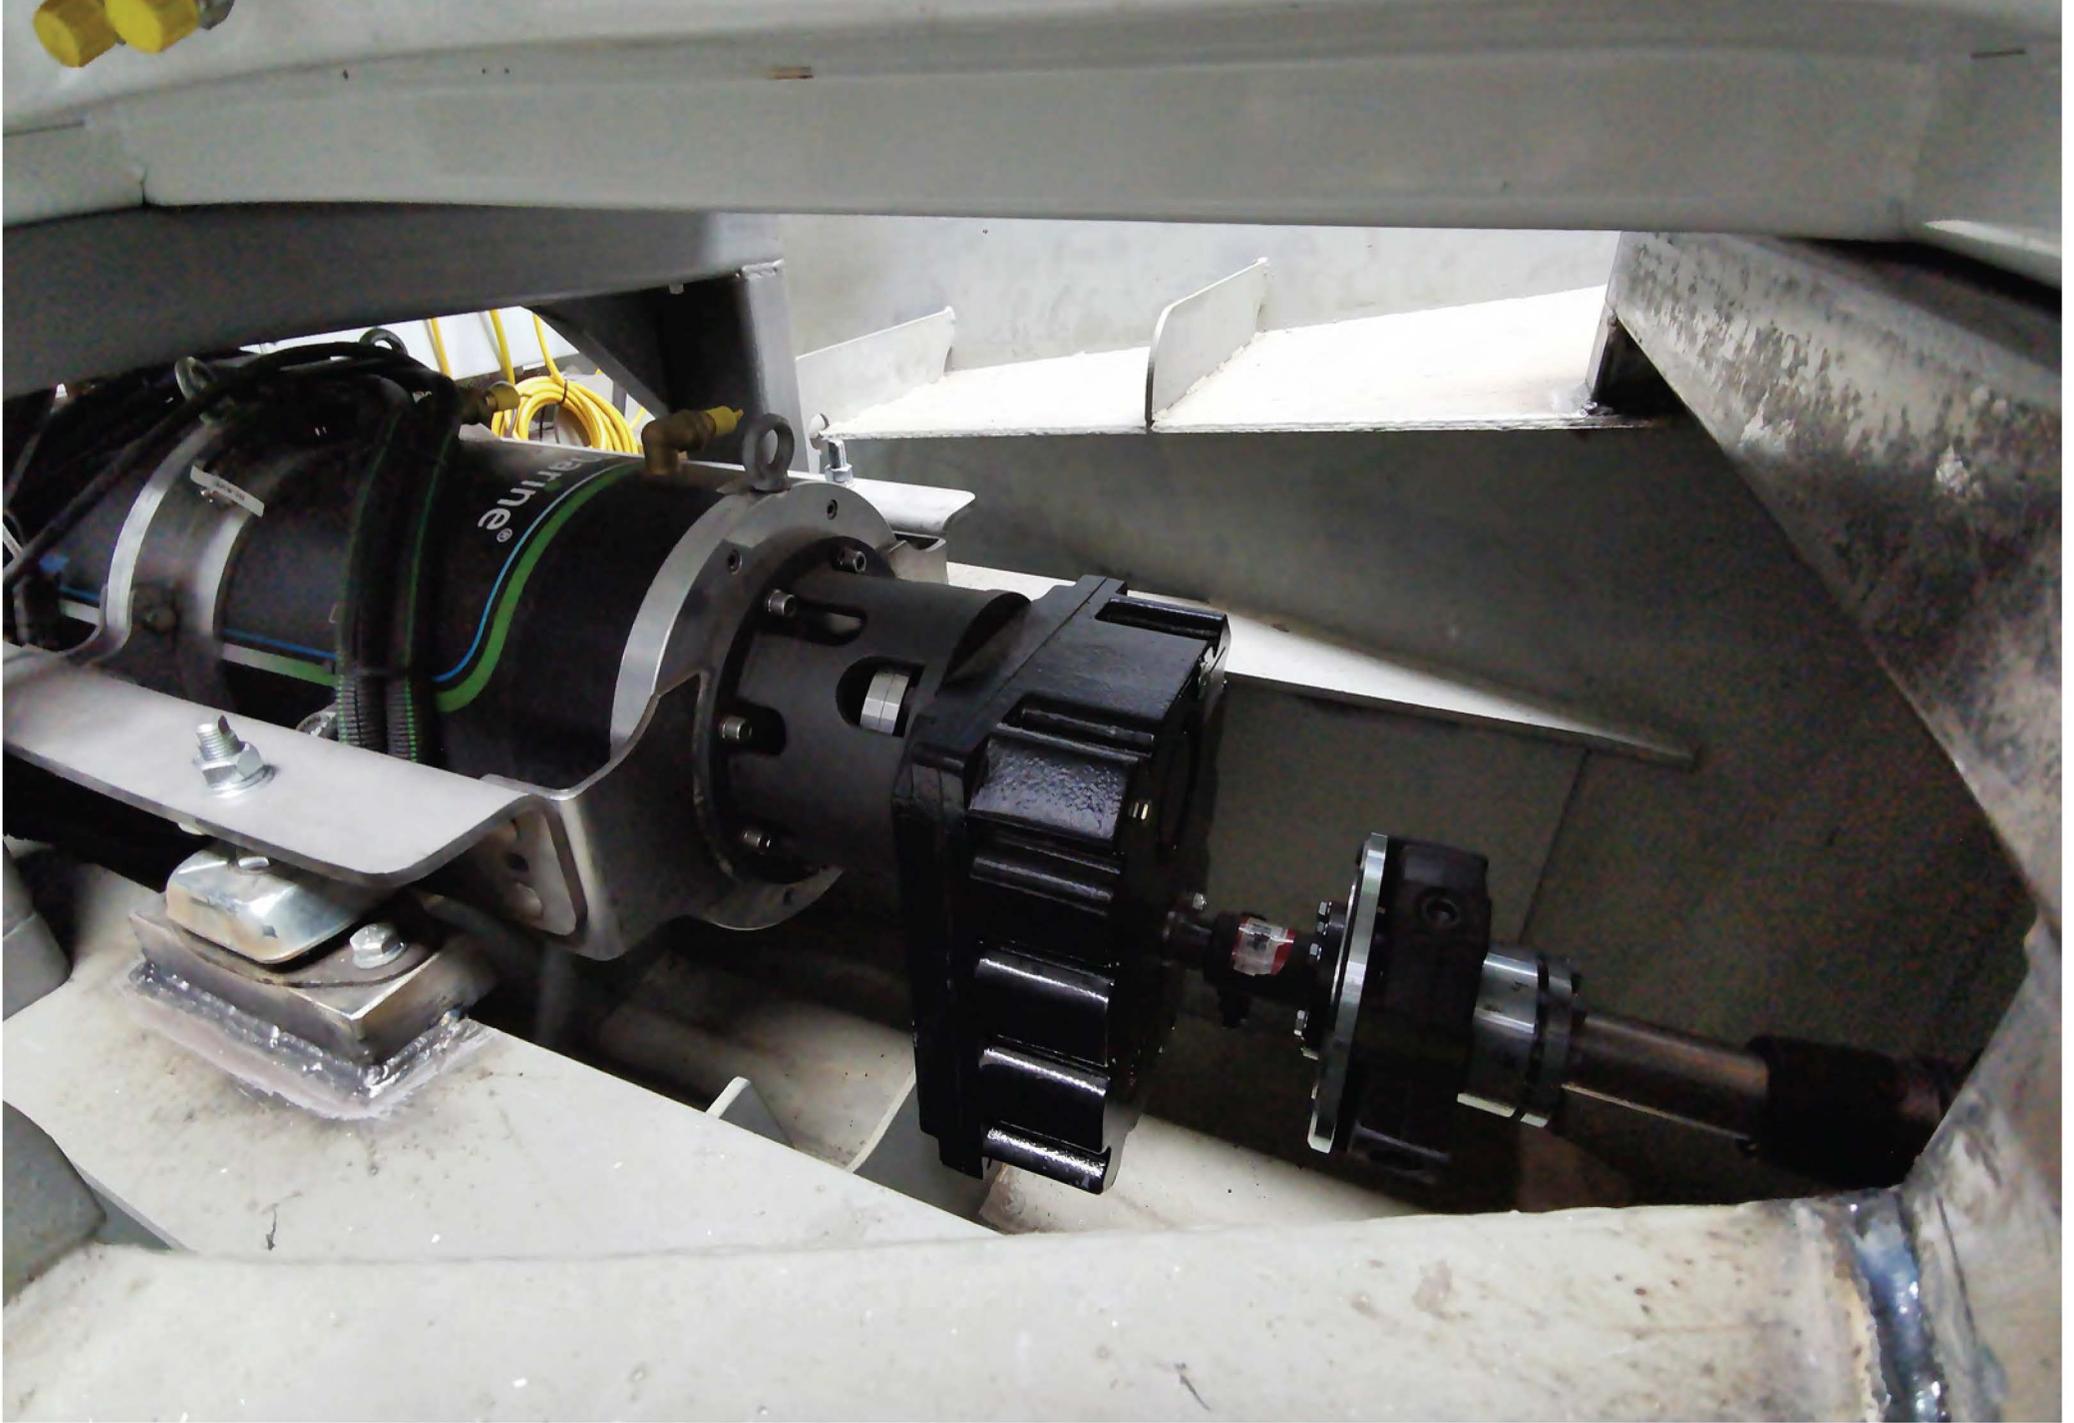

Motorgetriebe mit 3:1 Untersetzung.



Nicht angeschlossen. Was immer es auch ist.



Tankanschluss, der auch noch nicht angeschlossen ist.



Das Gleiche auf der anderen Seite



Batterieladegerät. Nicht definitiv angeschlossen.



Wäre für den hinteren Spudpal gedacht. Nicht angeschlossen.



Heiztank. Konnte nicht überprüft werden, ob funktionstüchtig.




Transrijn
INDUSTRIELE BATTERIJEN

Batterij type:	12 x 6 / 10 PzS 1550
Spanning :BAE	144 volt
Capaciteit :	1550 Ah/5h
Serienummer :	190211-01 D
Prod. datum :	02 - 2019
Gewicht : p/st 564 kg, totaal 6768 kg	

Tel: 0344-610438 Fax: 0344-616132

⚠️ ⚠️ ⚠️ ⚠️ ⚠️

Lüftung der Batterien fehlt. Kann noch nicht in Betrieb genommen werden.

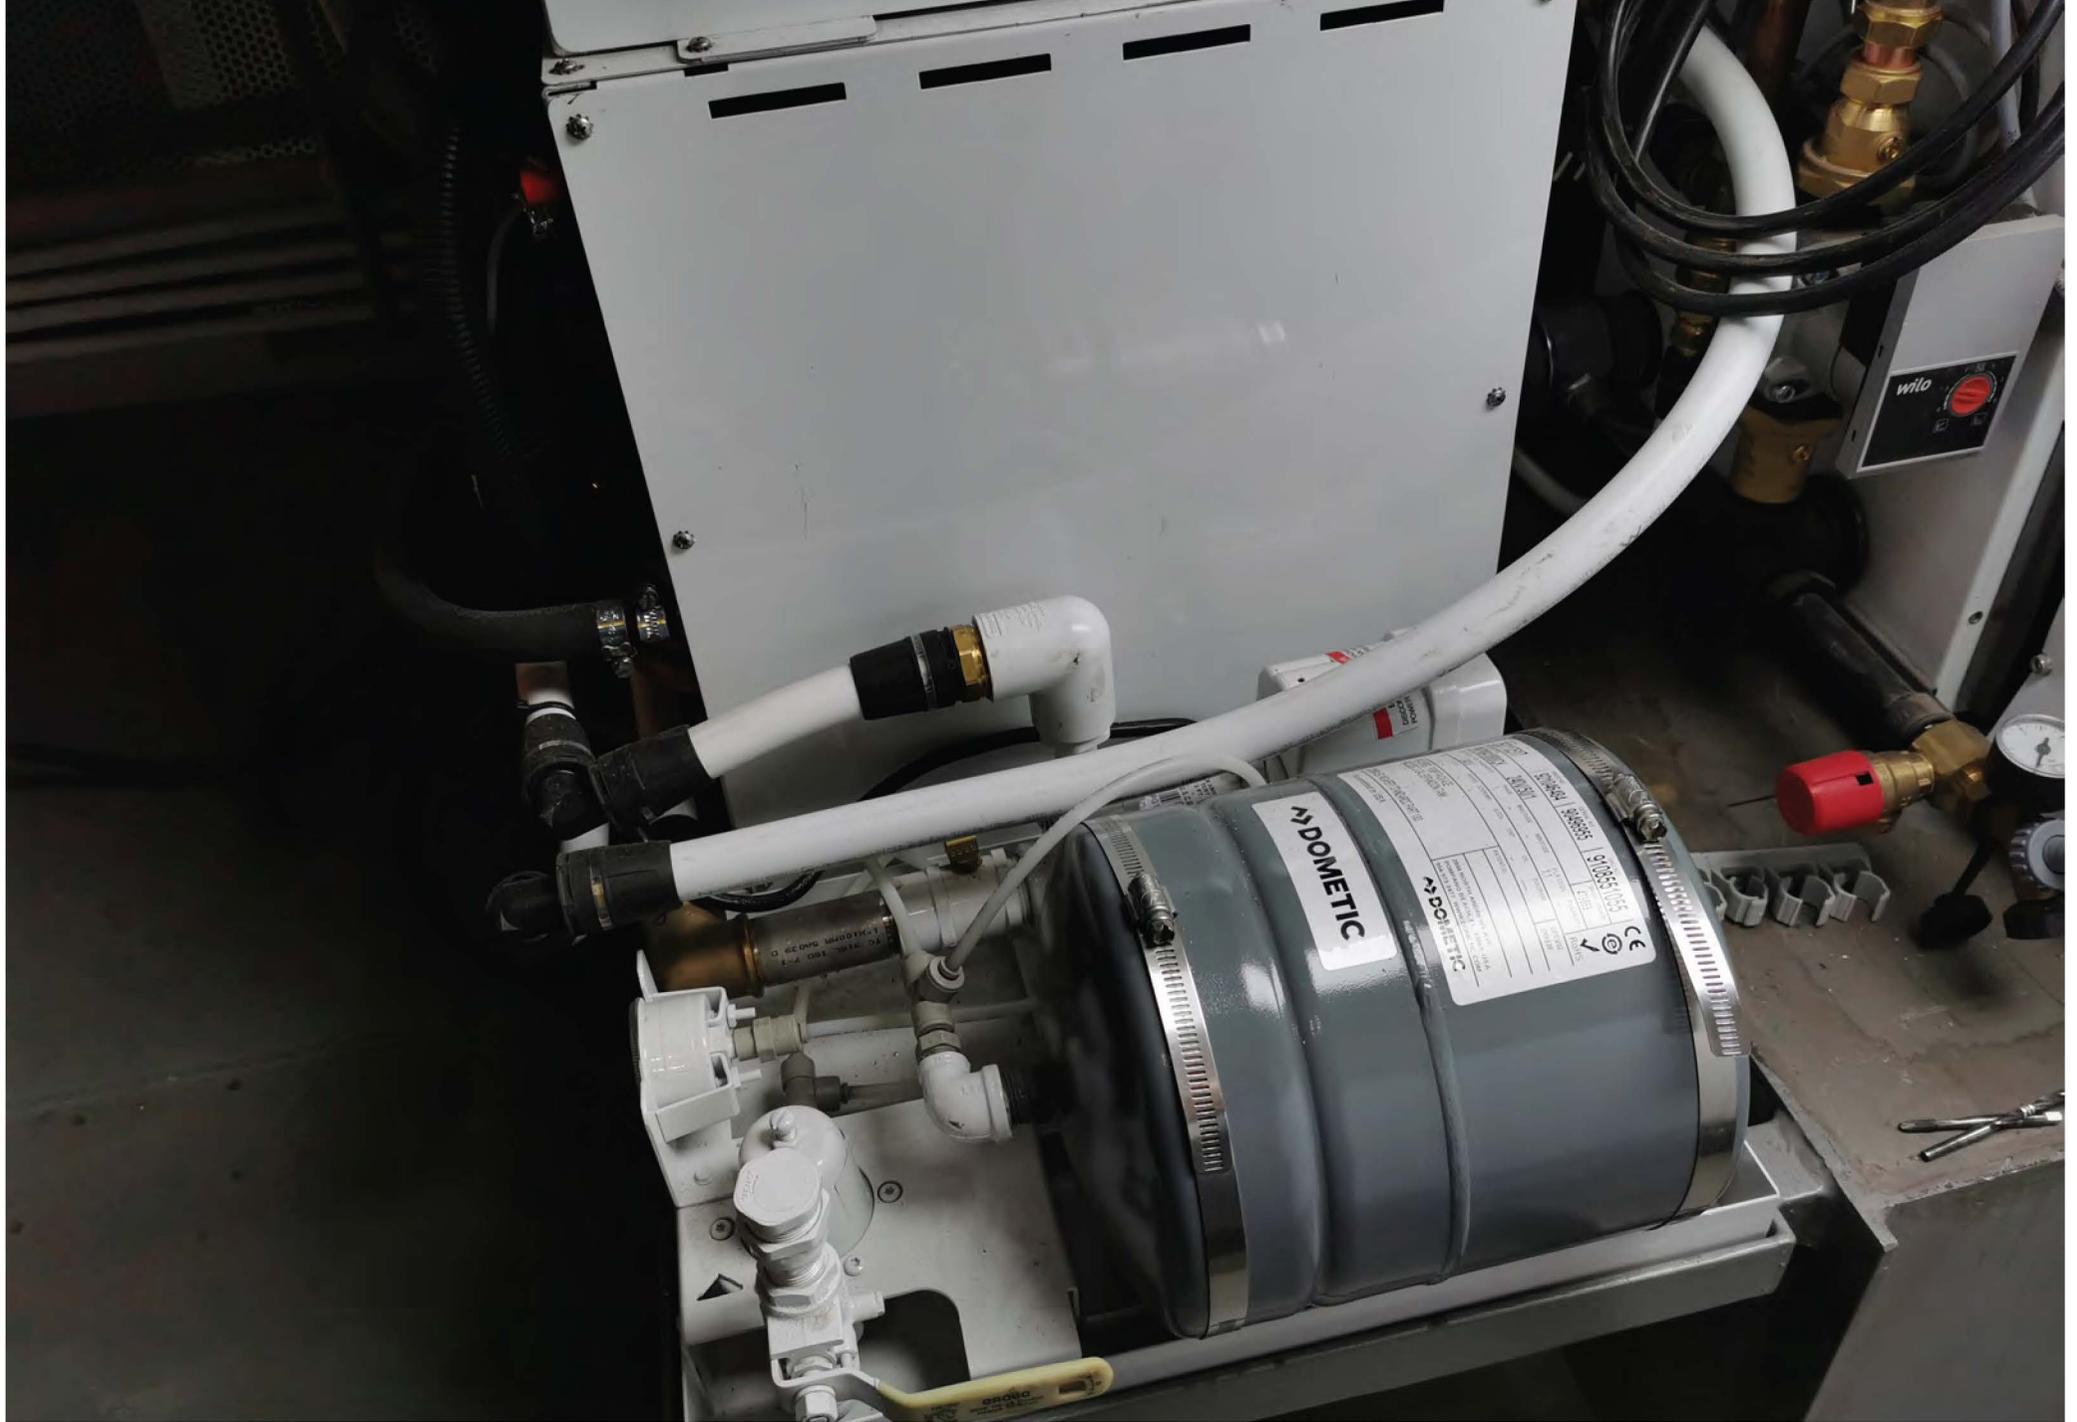


Klima-Kühlgerät. Die Abdeckung fehlt. Funktionstüchtigkeit konnte nicht überprüft werden.



Heizung - noch nicht angeschlossen.



Generator von oben. Die Einteilung und das Schema stimmen nicht. Wo haben die Fahrräder Platz? Die Lüftung des Motorraums und die Kühlung fehlt noch vollständig.

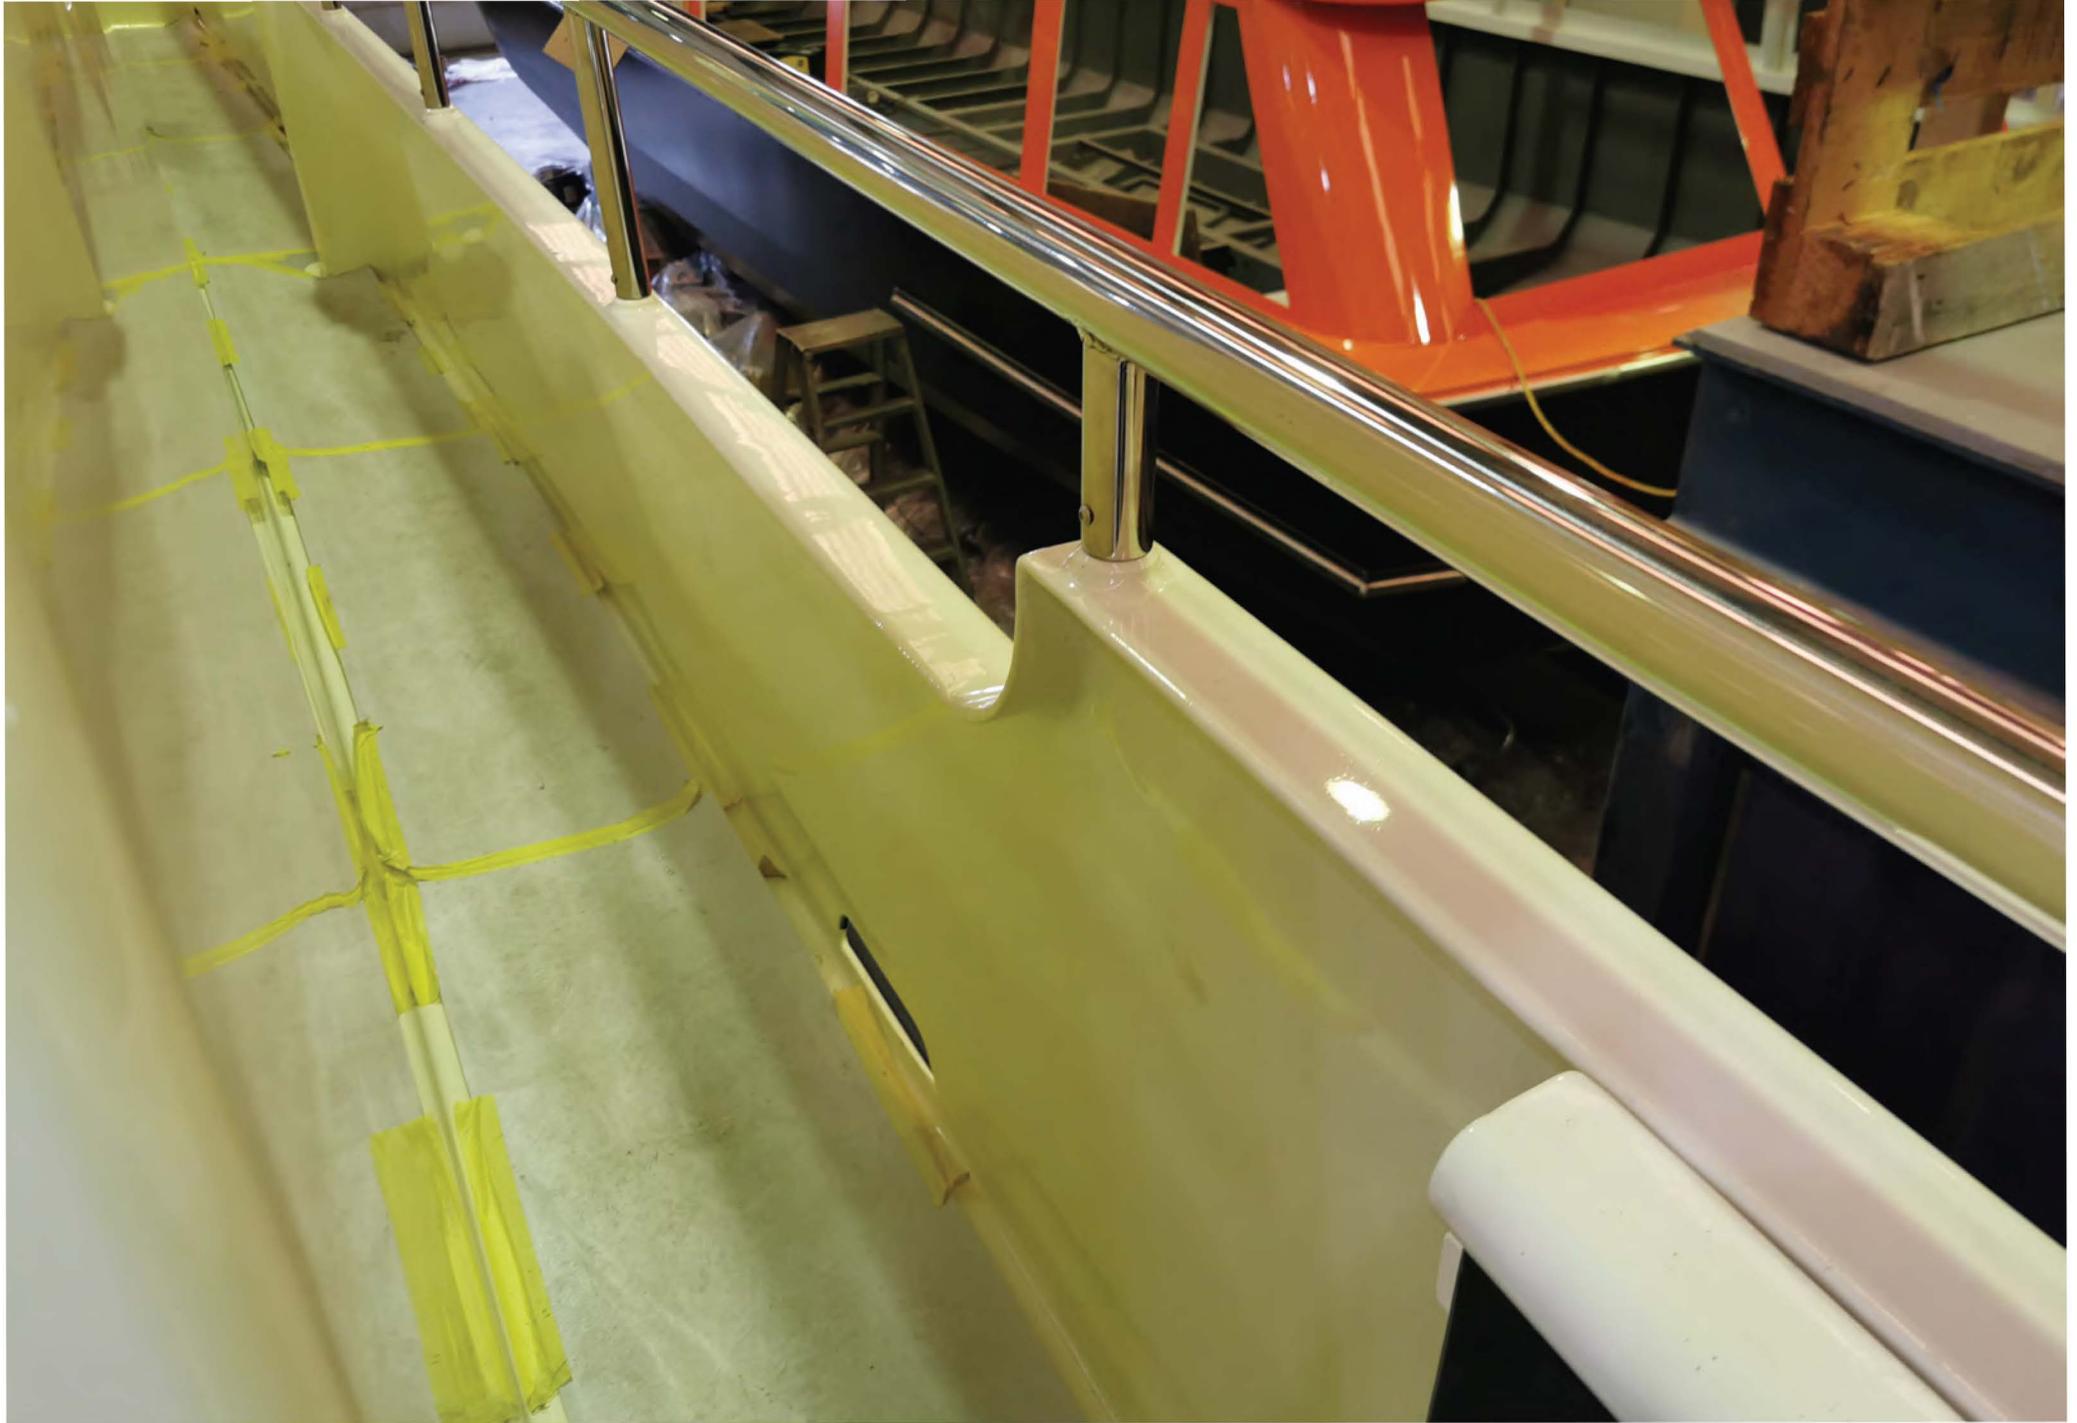

Die Reling ist drauf. Wir haben aber keine Nirostahl bestellt.



Die Farbe ist wie bestellt. Wir können nicht beurteilen, ob es zweimal gestrichen wurde. Wir hatten keinen Micrometer.



Hinterdeck. Wahrscheinlich Kabel für Kamera. Die gesamte Elektronik fehlt noch.



Kartenraum. Lose Gerät zu Kühlagregatsteuerung. Der von uns gelieferte Verstärker für die Stereoanlage ist noch nicht montiert. Wifi fehlt etc. etc.



Das Glas ist so schmutzig, dass wir nicht wissen, ob alles so ist wie wir es bestellt haben.



Es hat überall nicht sauber verarbeitete Farbe.



Kein Mast weit und breit in Sicht.



Wir akzeptieren, dass die Seitentür aussen nicht gestrichen wurde.



Abstand von Kante Steuerblatt bis Schraube 35 cm. Wir fürchten, dass der Abstand zu gross ist. Jenal-Syndrom.



Propeller sieht zwar schön aus, ist aber der Propeller für den Dieselmotor. Wir glauben nicht, dass dieser Propeller die richtige Dimension hat für den Elektromotor im Verhältnis zur Drehzahl (1:3 anstatt 1:2)

26 R 22 19





Eingang zum Maschinenraum für die Fahrräder :-)



Es fehlt die versprochene Gangway zur Plattform.

Für Roland ist es extrem wichtig, dass er die Navigationsgeräte und deren Positionierung auf dem Dashboard selber bestimmen kann. Aussehen ist uns wichtig.

KC schafft es einfach nicht und zu sagen, was er vorgesehen hat, damit wir uns abstimmen können.

